



I°

Villa Romana  
di Via Secolari  
Torre Annunziata

quaderno di Notizie di Arte  
classe Archeologico  
materia dal 10-11-71  
all' 11-7-73

---

Quelato 10-11-71 - La Ditta Di Tiello ha  
inigiato i lavori di  
scavo.

Quelato 27-11-71 - si sono nell'ambiente  
n. 29 sono stati rinvenuti  
i seguenti oggetti:  
n. 1 frammento di statua  
costituito pezzi colgati  
per di una barretta di marmo,  
n. 1 peso di Terracotta,  
e un frammento di una  
colonna di marmo  
finemente decorato e  
ribellito.

Quelato 30-11-71 - continua lo scavo nell'amb.  
n. 29.

" 1-12-71 - continua lo scavo nell'amb.  
n. 29

" 2-12-71 - " "

" 3-12-71 - " "

" 4-12-71 - durante lo scavo nell'ambiente  
n. 29 sono stati rinvenuti.

i seguenti oggetti:

n. 1 anfora in frammenti  
di terracotta rossa, di forma  
allungata collo lungo e  
anse tubolari doppie, inscrite  
sotto l'orlo e sulle spalle,

n. 1 Lucerna di terracotta  
di colore rossiccio, di pregevole  
fattura - sul disco vi è  
cintolato ben marcato; una  
didimite, femminile con  
ancorini, l'ansa è nel  
quello, sovrastata da  
una placca triangolare  
con motivi floreali a  
cintolato nella parte superiore  
sul fondo vi è il marchio  
in piante pedis. con  
lettere incise -

Luclato, 5-12-71 - Cantiere ferro (Domenico)  
" " 6-12-71 - nell'ambiente n. 29 e  
stato rinvenuto un' anfora

in minuti frammenti -  
 Quotato 7-12-71 - si scava nell'ambiente  
 n. 31 - sono stati rinvenuti  
 n. 2 anfore in frammenti  
 e n. 8 lucerne di Terracotta,  
 di grande dimensioni,  
 finemente decorate,  
 rotolate in minuti frammenti  
 frammenti non restaurabili.

Quotato 8-12-71 - Contiene fuso (festo)  
 " " 9-12-71 - si scava nell'amb. n. 31  
 sono state rinvenute un  
 congruo numero di piccole  
 lucerne di Terracotta  
 di cui n. 30 integre,  
 n. 12 mancanti di  
 pezzi frammenti  
 non restaurabili  
 e numerosi frammenti.  
 N. 1 piatto tipo Archimedeo  
 interamente decorato  
 da cerchi concentrici

all'circa diametro e circa  
 cm. 40, e in numerosi  
 frammenti ma restaurabili,  
 n. 2 pezzi ch'avevano  
 finalmente lavorati  
 e n. 4 squadrati preparati  
 opportunamente probabilmente  
 a un letto. Nell'amb. 31 ]

10-12-71 - Continuano i lavori ch'avevano ]  
 11-12-71 - Riv. n. 2 soffore in frammenti.  
 12-12-71 - Cortiere fermo (Domini)

13-12-71 -  
 14-12-71 - } continuano i lavori ch'  
 15-12-71 - } sono negli ambienti  
 16 " " } 27-28-29-31 e 32

17 " "

18 " "

19 " "

Cortiere fermo (Domini)

In data 20-12-71 - I lavori continuano  
 con un giorno  
 precedenti.

In data 21-12-71 - si scote nell'ambiente  
 n. 24 ed è stato rinvenuto  
 uno scivolo di bronzo  
 di cm. 16 n. 1 Trave  
 di legno carbonizzato  
 rinvenuto nei pressi del  
 Larario del detto  
 ambiente.

In data 22-12-71 - si scote nell'ambiente  
 n. 31 e sono state  
 rinvenute n. 8 grate  
 lucerne di terracotta,  
 in minuti frammenti  
 ma indubbiamente di  
 pregiate fatture e  
 restaurabile. -

In data 23-12-71 - nell'ambiente n. 31  
 è stata rinvenuta  
 una grossa anfora  
 in minuti frammenti  
 difficilmente restaurabili.

In data 24-12-71 - Continuano i lavori di  
 scavo -

In data 25-12-71 - (cantiere fermo-festa)

" " 26-12-71 - " " "

" " 27-12-71 - I lavori continuano nell'ambiente n. 32 sono state messe alla luce: una tettoia obliqua quale sono state recuperate tegole e coppi d'argilla, nell'amb. sono venute alla luce n. 4 colonne decorate a stucco -

In data 28-12-71 } I lavori continuano negli  
 " " 29 " " } - ambienti 26-27 e 32  
 " " 30 " " }

In data 31-12-71 - (cantiere fermo/festa)

" " 1-1-72 - " " "

" " 2-1-72 - si ricomincia nell'ambiente n. 27

" " 3-1-72 - continuano lo scavo nell'ambiente n. 27 e sono state rinvenute:

frammenti di Tegole  
con bollo e frammenti  
di marmo -

Quelato 11-1-42 - si trova nell'ambiente  
n. 26 e sono tenuti  
alla luce n. 3 coperti  
per pentole, di Terracotta,  
n. 1 bozze di marmo  
bianco circolare  
con orli sargomati  
in vari frammenti  
e scheggiato, non  
restaurabile, il  
diametro massimo  
è di cm. 26 lo spessore  
è cm. 5,5

Quelato 5-1-42 - si trova nell'ambiente  
n. 31 sono state  
recuperate n. 6 grosse  
lucerne di Terracotta  
firmate decorate,  
in minuti frammenti.  
non restaurabili



Inoltrato 6-1-42 - Continuare fermo

" " 7 " " " "

" " 8 " " " "

" " 9 " " " "

" " 10-1-42 } Lavori continuano

" " 11 " " } negli ambienti

" " 12 " " } - n. 24-25-26-27 e 32

" " 13 " " }

" " 14 " " }

" " 15-1-42 } si scava nell'ambiente

n. 24 sono state

rimovute due frammenti

di antefissi di Terracotta

e stucco decorato

Inoltrato 16-1-42 - Continuare fermo

" " 17-1-42 - Continuano lavori di  
scavi e di restauro

" " 18-1-42 - } si scava nell'ambiente

" " 19-1-42 - } n. 28 state sono

" " 20-1-42 } state rimovute due

blocchi di marmo

decorati a rilievo

In data 21-1-42 - Restauro e costruzione  
di muratura

In data 22-1-42 - Ripristinato lo sgabro  
dell'ambiente n. 34<sup>(35)</sup> e  
stato rinterato in  
elemento di muratura  
in bronzo

In data 23-1-42 (Contiere fermo)

" " 24-1-42 - Restauro e costruzione  
di muratura.

" " 25-1-42 " "

" " 26-1-42 " "

" " 27 " " " "

" " 28 " " " "

" " 29 " " " "

In data 30-1-42 - Contiere fermo

" " 31-1-42 - Lavori di restauro

" " 1-2-42 -

" " 2-2-42

" " 3-2-42

" " 4-2-42

" " 5-2-42

In data 6-2-72 - (continua fermo)  
 u u 7 u u  
 u u 8 u u  
 u u 9 u u  
 u u 10 u u  
 u u 11 u u  
 u u 12 u u  
 u u 13 u u - (~~13~~ fermo)  
 u u 14 u u  
 u u 15 u u al 29-2-72 =

lavoratori  
 rettore  
 Stucco

continuano i lavori  
 di rettore e ricomposi-  
 zione stucchi -

In data 1-3-72 = I lavori continuano  
 come nei giorni  
 precedenti -

fine lavori

./.

Inchiesta 6-11-1942 Riferimento dei lavoratori  
di nuovo lato moral-  
est-ovest-

Inchiesta 7-16-

22 e 23 novembre 1942 Carattere fermo  
per lo sciopero del personale  
di custodia

Inchiesta 24-11-42 - Riferimento dei lavoratori  
di nuovo lato moral  
est-moral-ovest- e  
stato rinviato tra i  
materiali di risulta  
a circa m. 10 dal  
piano di campagna  
m. 1 Capitello di marmo  
bianco di m. 0,30  
di altezza

Inchiesta 1-12-42 riferimento dei lavoratori di  
settore Tegole e  
pubblici uffici.

In data, 15-12-72 È stato rinvenuto  
 un troncone di colonna  
 di marmo grigio di  
 circa m. 0,80 di  
 altezza e m. 0,50  
 di diametro - di m. 2  
 dal piano di campagna  
 lato Est-est.

15-12-72 Ritrovamento di una  
 lastra di marmo  
 bianco di forma  
 rettangolare di m. 0,56 x  
 0,365 con un foro al  
 centro, appartenente  
 probabilmente ad  
 una fontana - sulla  
 zona nord-est del  
 giardino di m. 10  
 dal piano di campagna.  
 Contiene ferro ~~...~~

16-12-73

\*/.

In data 18-12-72 Continuo lo scarto  
nella zona mont.  
est.

" " 23-12-72 Continuo lo scarto  
nella zona mont.  
est.

" " dal 24 al 26 dicembre 72 cantiere fermo

" " dal 27 al 30-12-72 Continuo lo scarto  
nella zona mont. est.

" " dal 31/12/72  
al 3/1/73 cantiere fermo

In data 4-1-73 Riprendo gli scarti  
di scarto nella zona  
mont. - est.

" " 5-6-7-8-

9-10-11- i scarti continuano

12-13-14-15- come nei giorni

gen. 1973 precedenti.

1/

In data 16-1-43 - Rintenerimento di una  
 " " 17 " " lastre di marmo  
 " " 18 " " grigio di forma  
 il lavoro ha rettangolare di m.  
 continuato nelle 0,44 x 0,16 restaurabile,  
 zone di ~~gioco~~ di circa m. 1,50  
 frantumate. di altezza stol  
 giardino dell'amb.  
 m. 35 lato nord-est.

In data 19-1-43 Nel giardino lato  
 nord est nelle vicinanze  
 delle colonne abbattute  
 di circa m. 2 di altezza  
 stol giardino sono  
 stati rinvenuti frammenti  
 di Terracotta bruciata  
 appartenenti probabilmente  
 ad un fiesco, e m. 1  
 Pentola in frammenti  
 non restaurabile questo

In data dal 20 al 23-1-43 e tratto, ridotto sul  
 si è scavato nella soffitto in calcinaccio  
 zone nord-est. (giardino) del III° corridoio

Quelator 24-1-73 Nel giardino lato  
 nord est or m. 2.50  
 stato pavimento nelle  
 vicinanze delle colonne  
 abbattute e stato  
 rinvenuto n. 1  
 fibulor in bronzo.

Quelator 25-1-73

nell'ambiente n. 35  
 or m. 2.50 stato pavimento  
 lato nord. est sono  
 stati rinvenuti frutt. di  
 mare (Balde) e n. 1  
 moneta in bronzo  
 esportor da uno strato  
 di materiale botico

Quelator 26 e 27 lo scavo continua  
 nello zano nord est.

28-1-73 Continuare lavoro

/.



In data 29-1-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti. lato  
nord-est.

" " 30-1-73 " "

" " 31-1-73 Il lavoro continua  
sempre nello stesso  
nord-est. Tra i materiali  
di risulta è stato  
rilevato un n. 1,50  
che il piano di campagna  
un frammento di lucerna  
di tipo in due parti  
restaurabili.

" " 1-2-73 - Il lavoro odierno  
continua sempre  
come nei giorni  
precedenti, si è  
rilevato anche il  
lavoro di recupero  
e di ricomposizione  
degli stucchi, della  
parete lato est  
andante n. 34

o/

In data 2-2-73 del grande peristilio  
Il lavoro si è svolto  
continuato come  
nei giorni precedenti.

In data 3-2-73 " "

" " 4-2-73 Continuare lavoro

" " 5-2-73 Il lavoro continua  
presso le colonne  
abbattute lato sud-est.  
nelle vicinanze della  
parete dell'quad. n. 34  
è stata rinvenuta  
a circa m. 2 dal  
partimento. Tra i  
materiali di risulta,  
una capella di ferro  
azzurro in frammenti,  
ma in parte restaurabili.

In data 6-2-73 Il lavoro si è svolto  
continuato nella zona

1/

amb. n. 34  
 sul tutto.  
 nel - est. Tra i materiali  
 si di ciurlo e storta  
 ciurlo n. 1 Capella  
 di Terracotta, pezzo  
 chiaro. base n. 0,10  
 alt. n. 0,06 di colore  
 giallastro, mancante  
 di un terzo dell'orlo  
 e della pancia, che  
 reca motivi rilievi.  
 Il pezzo è stato rinve-  
 nuto or all. 2,50 dal  
 fianco di campagna  
 E' iniziato il lavoro  
 di ricostituzione e  
 restauro delle colonne  
 del granole primitivo  
 nel tutto est - amb. 34  
 Il lavoro continua nella  
 zona Est. Amb. 34 (come  
 nei giorni precedenti);  
 Tra il materiale di

In data 7-2-73

risultar fra le colonne  
 abbattute del peristilio  
 di circa m. 2 del  
 portamento sono stati  
 rinvenuti i seguenti  
 oggetti: marmo bianco  
 n. 1 frammento di  
 stucco, probabilmente  
 la mano sinistra  
 e n. 1 Testina di  
 animale, ~~o~~ forse,  
 elemento di fantasia.

In data 8-2-43 Il lavoro di scavo continua  
 nello scavo sud-est.  
 a m. 2 circa del portamento  
 Tra le colonne abbattute  
 sono stati rinvenuti  
 i seguenti oggetti:  
 bronzo n. 2 frammenti  
 appartenenti probabilmente  
 alla meccanizzazione

num. 34

di mobili e u. 1 quello di n. 6  
 con peso a mo di  
 battenti. Ferramenta  
 bruciate - frammenti  
 soprattutto del un  
 pezzo, in parte  
 restaurabili: l'ultima  
 pure il lavoro di  
 ricostruzione delle  
 colonne -

In data 9-2-73

Il lavoro di restauro continua  
 nello stato suol. est.  
 Continua pure il lavoro  
 di ricostruzione delle  
 colonne. Sobbottate del  
 peristilio e la conservazione  
 degli apparecchi -

In data 10-2-73

Il lavoro di restauro  
 continua come me

In data 11-2-73 | Giochi precedenti.  
Cantiere pieno

In data 12-2-73 | Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti si  
ricompa lo stacco, le  
colonne, e si lavora  
nella zona not-est.

In data 13-2-73 | Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti.

" " 14-2-73 | Idem

" " 15-2-73 | Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti.

" " 16-2-73 | Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti.

In data 17-2-73 | Idem.

" " 18-2-73 | Cantiere pieno

/.

In data 19-2-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

In data 20-2-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

In data 21-2-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti: Nella zona  
~~est.~~ est. or. su. si sono  
stati piano di campagna  
sono stati rinvenuti  
n. 10 frammenti di  
piombo in pezzi irregol.  
attribuiti (a loro volta)  
o frammenti di Terreotte  
appartenenti ad un  
giorno di lavoro. difficile da  
restaurabile.

In data 22-2-73 Il lavoro continua  
nella zona sud-est

In data 23-2-73 Il lavoro continua  
come nei giorni precedenti  
si restaurano gli atuechi  
e si scava nella zona  
sud-est.

" " 24-2-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

" " 25-2-73 Continuare fermo

" " 26-2-73 Il lavoro continua  
nella zona sud-est -  
si restaurano le colonne  
e si ricominciano gli  
atuechi e i tepali antichi

" " 27-2-73 Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti

/.



In data 28-2-73

Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

In data 1-3-73

Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

In data 2-3-73

Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

In data 3-3-73

Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti; è stato  
rinvenuto a circa  
m. 5 dal partimento  
e a m. 4 dal muro  
late Ent. dell'amb. n. 35 m. 1  
capitello di marmo  
bianco (frammentato)

j

In data 4-3-43 - Continuare fermo

In data 5-3-43 - Il lavoro continua  
 come nei giorni precedenti;  
 È stato rinvenuto a circa  
 m. 2 dal pavimento ed  
 a m. 5 dall'ultima  
 colonna del peristilio  
 lato est., tra i materiali  
 di risulta una (Stele)  
 in due pezzi così composti:  
 1°) altezza m. 0,22  
 larghezza m. 0,34 x 0,275  
 2°) altezza m. 0,80  
 larghezza m. 0,17 x 0,14  
 manca un frammento  
 dal verso e dalla  
 estremità superiore,  
 nello stesso posto è stato  
 trovato un pedice in  
 mattoni di terracotta  
 delle seguenti misure:

altezza m. 0,52  
larghezza m. 40 X m. 40

In data 6-3-43 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precendenti, sul lato  
Est. a circa m. 5  
dall'ultima colonna  
del peristilio m. 1 dal pavimento  
sono stati rinvenuti  
numerosi frammenti  
di terracotta di diverso  
tipo, fra cui un fregio  
che ha come base di  
decorazione di  
fiori altezza m. 0,14  
di cui il pezzo m. 0,10  
manca un frammento  
della pedana e della  
base. Si è anche per parte  
frammentati.

In data 7-3-43 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precendenti -

- Su data 8-3-73 Il lavoro ch'heato  
 continua, nella  
 zona Est, si ricostituisce  
 ne gli stucchi ed il  
 peristil'io del lato nord-  
 est.
- Su data 9-3-73 Il lavoro continua  
 come nei giorni  
 precedenti; si ricostituisce  
 il colonnato del lato nord-  
 est e si ricambiano  
 gli stucchi
- Su data 10-3-73 Il lavoro è continuato  
 come nei giorni  
 precedenti
- Su data 11-3-73 Continuare primo
- Su data 12-3-73 Il lavoro è continuato  
 come nei giorni  
 precedenti: si è scordato

nella zona di cui si  
sono ricomposti  
gli attecchi, si è  
proceduto alla conversione  
in chi otti, e si  
ricostituiscono gli  
ambienti del  
peristilio del lato  
nord. est.

In data 13-3-73 Il lavoro di scavo  
continua nella  
zona sud. est.  
ed a circa m. 3  
dal perimetro dell'amb.  
n. 24 ed a m. 5 circa  
dal limite del  
canale secco, sono  
state rinvenute m. 3  
aureole in frammenti,  
~~o~~ m. di un  
piccolo ballatoio.

o/.

dei piani superiori

In data 14-3-73 } Il lavoro continua  
 In data 15-3-73 } come nei giorni  
 In data 16-3-73 } precedenti: sono state  
 In data 17-3-73 } messe alla luce n. 3  
 colonne con matiti  
 sul solaio, in strucco,  
 in discrete condizioni  
 di conservazione -  
 Solen.

In data 18-3-73 Coattiere fermo

" " 19-3-73 Coattiere fermo

In data 20-3-73 Lo scavo continua  
 nella zona sud-est,  
 si ricominciano gli  
 stacchi e le tegole,  
 continua la ricostruzione  
 del primitivo lato sud-est.

In data 21-3-73 Come nei giorni precedenti

In data 22-3-73 " "

In data 23-3-73 " "

" " 24-3-73 " "

In data 25-3-73 Coattive fermo

" " 26-3-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti nella zona mol. est. si ricominciano gli ambicenti ed il peristilio - nella zona

" " 27-3-73 mol. est. continua il lavoro di restauro -

" " 28-3-73 si restauro nella zona mol. est, continuano i lavori di restauro

/.

del peristoma nord-est  
 e la ricomposizione  
 degli stracci e la  
 composizione degli  
 affreschi peristomi.  
 Nelle zone sud-est.  
 Tra le colonne con  
 i metati sul ovolo, nella  
 vicinanza dell'ambiente  
 n. 24 sono stati rinvenuti  
 n. 5 anafili appartenenti  
 ai ceppi di Terracotta  
 con ricinti ben marcati  
 raffiguranti alcuni  
 maschere conute e altri  
 metati floreali fram-  
 mentati.

Nel data 20-3-43 Il lavoro continua  
 come mi piace  
 preesistente, si è proceduto  
 al getto in n. 24 di un  
 soffitto con stracci nei  
 pressi dell'ambiente n. 24.



In data 31-3-43

Il lavoro di scavo  
continua nella zona  
Mud. est. e si ricompongono  
gli stacchi.

In data 1-4-43

Cantiere fermo

In data 2-4-43

Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti. Si  
ricompongono gli stacchi;  
si scava nella zona  
Mud. est. ~~ad~~ stato senza  
in base una quinta  
colonna con motivi  
nel fusto, (amb. n. 24),  
e buona parte del  
soffitto in tegole di  
ceppi di argilla rossa,  
sostentate da travetti;  
di cui rivediamo le  
impronte che risultano  
di m. 0,10 x m. 0,8 di  
spessore.

In data 3-4-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti, si resta  
nella zona sud-est.

In data 4-4-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

In data 5-4-73 Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti  
si resta nella zona  
sud-est. ed è venuta  
oltre l'area f'ultima  
colonna del peristilio  
nell'ambiente n. 24  
si sono recuperate  
numerosi tegole di  
argilla, in frammenti.

In data 6-4-73 Il lavoro continua  
come nei giorni precedenti  
/.

In data 7-4-73

Il lavoro di scavo continua  
 nelle zone sud-est.  
 Lungo il fiume, in  
 un cunicolo borbonico  
 si notano delle colonne  
 in frammenti, e ingessi  
 di stami. continua  
 la ricomposizione  
 degli stucchi.

In data 8-4-73

Cantiere fermo -

In data 9-4-73

Il lavoro continua  
 come nei giorni precedenti.  
 Si scava lungo il  
 fiume nell'ambiente  
 m. 24 nei pressi di  
 un cunicolo borbonico.  
 dove si notano frammenti  
 di colonne e strutture  
 con stucco. Si è appurato  
 certo che il persistito

dell'ambiente n. 24  
si compari di n. 6  
colonne con motivi  
nel sottoli - e terminano

con un fusto piramidale e un muro o riquadro -  
In data 10-4-43

Il lavoro continua  
sempre nella zona  
est. lungo il canale  
e lo scavo si comincia  
a Tulle e, nord-est.  
Sono stati rinvenuti nella  
detta zona, tra i materiali  
di risulta, n. 5 antefisse  
di argilla rossa, per cippi;  
decorati; o rivisti con  
morceati in frammenti  
e n. 4 gusci di lumache.

In data 11-4-43

Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti  
si scava nella zona  
est. ed è stato messo in luce  
quasi completamente un  
definito ambiente n. 40

Sono che è stato

In data 12-4-73

Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti; si lavora  
nella zona est-  
verso nord. est. (paul. 40)  
col a m. 6 circa  
dall' corso del canale  
e m. 2 dall' partimento  
è stata rinvenuta  
una prima colonna  
di tipo corinzio, in  
frammenti, non restaurabile

In data 13-4-73

Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti; e nella  
zona sud. est.  
Tra i materiali  
di risulta sono  
stati rinvenuti n. 3  
metefisse per cippi  
in frammenti; e una  
seconda colonna in frammenti  
non restaurabile

In data 14-4-43 Il lavoro si è svolto  
continuando nella  
zona est. (caud. 40)

In data 15-4-43 Continuare fermo

In data 16-4-43 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti, si è svolto  
nella zona est.  
Tramontalmente  
al corso del canale  
sono state rinvenute  
ancora ~~una~~ <sup>una</sup> ~~30~~ <sup>30</sup> tonnellate  
di colonne dello  
stesso tipo di quelle  
precedenti - e tra  
i materiali si  
risulta un'autefitta  
per cippi di argilla  
rossa, ~~con~~ <sup>con</sup> mattoni  
e tegole e rivetti  
di mancati.

In data 14-4-73. Il lavoro continua  
 come nei giorni  
 precedenti, nell'ambiente  
 n. 60 è stato ritrovato  
 tra i materiali di  
 risulta, una antefissa  
 per cippi di argilla  
 rosse.

In data 18-6-73. Il lavoro continua come  
 nei giorni precedenti, si  
 ricompongono gli stucchi  
 dei fori dell'ambiente, si  
 scava nella zona sud-  
 est. nei pressi dell'ambien-  
 te n. 60. È venuta alla  
 luce una quarta colonna,  
 alzata, nel pavimento  
 fra il primo strato di  
 lapillo. Si presenta in  
 buon stato di conservazione  
 ed è restaurabile  
 durante i lavori di

39

ricchiamente e  
pubbica. Nell'ambiente  
n. 29 morficamente  
è stato ritrovato un  
frammento di marmo  
bianco decorato e  
ritrovato con un  
raffigurante una  
cosa di cui male  
il frammento misura  
m. 0,14 circa x m. 0,09.  
Tra i materiali di  
risultato nelle vicinanza  
dell'ambiente n. 40 è  
stato ritrovato una  
dentifissa per capelli  
d'argilla rotta in  
frammenti.

Su data 19-4-73 il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti, è stato



mettes i'n luce una  
 quinta colonna è  
 stata trattata  
 abbattuta nel pavimento  
 Tra il primo strato  
 di laquila, è i'n  
 buona condizione  
 ed è restituita

In data 20-4-73 Il lavoro con  
 come nei giorni  
 precedenti, si porta  
 nella zona est. e si  
 ricambiano gli stucchi

In data 21-4-73 Il lavoro è continuato  
 come nei giorni  
 precedenti. fino alle  
 ore 12

In data 22-4-73 Continuare lavoro per la  
 parte Porquelli

In data 23-4-73

" " 24-4-73

" " 25-4-73

" " 26-4-73

Contiere fermo

Contiere fermo

Contiere fermo

Il lavoro riprende,  
si scava nella zona  
met. est. e si ricompa-  
gono gli stucchi;  
nella zona di centro  
è stata alla luce  
una alta colonna  
del tipo di quelle  
precedenti.

In data 27-4-73

Il lavoro continua  
nella zona met. est  
è stata messa in luce  
una alta colonna  
orbicolare, ma rovinata  
e n. 4 antefisse per  
ceppi di argilla, tutto  
in frammenti.

In data 28-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti si resta nella zona sud-est. nei pressi dell'ambiente n. 40, scavando nell'ambiente n. 31 nella roglia di Maximo è stato rinvenuto un carbonio di bronzo del tipo di bicchiere.

In data 29-4-73 Cantiere fermo

In data 30-4-73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti, si resta nella zona sud-est. Tra l'ambiente n. 30 e l'ambiente n. 40

In data 1-5-73 Cantiere fermo

In data 2-5-73 Il lavoro si è svolto  
 continuando nella  
 zona sud-est.  
 Si è lavorato negli  
 ambienti 38 e 39  
 tra i materiali  
 che risulta si sono  
 ritrovati, ma cerchia  
 completamente ricoperta  
 di materiale liscio.

In data 3-5-73 Il lavoro continua  
 come nei giorni  
 precedenti. Si lavora  
 nella zona sud-est.  
 tra gli ambienti n. 39  
 e 40. nell'ambiente  
 n. 39 tra i materiali  
 che risulta sono  
 state ritrovate n. 2  
 cerchie che sono  
 completamente coperte

si materiale latico  
 frammento e residui  
 di legno carbonizzato  
 la loro lunghezza varia  
 tra m. 0,15 e m. 0,20  
 si procede al recupero  
 negli stucchi negli ambienti  
 in citati e si ricompongono.


In data 14-5-73 Il lavoro continua  
 come nei giorni  
 precedenti, si resta  
 nella zona sud-est.  
 tra gli ambienti  
 n. 28 e 40, si recuperano  
 gli stucchi e si  
 ricompongono.

In data 5-5-73 Il lavoro continua  
 come nei giorni  
 precedenti.

In data 6-5-73 Continuare fermo


In data 4.5.73

Il lavoro continua  
 come nei giorni precedenti.  
 Si procede nella zona  
 sud est del piano  
 superiore del preesistente  
 dell'ambiente n. 32  
 di nome Tracce  
 di tratti della copertura  
 sul Trave in diagonale  
 della misura di 0,19 x 0,30  
 circa e altri Traversi,  
 di cui m. 0,08 x 0,10  
 sono stati rimossi  
 anche frammenti  
 di buche di castagne,  
 la Tracciatura in  
 muratura, con stucco  
 bianco dal seguente  
 profilo:

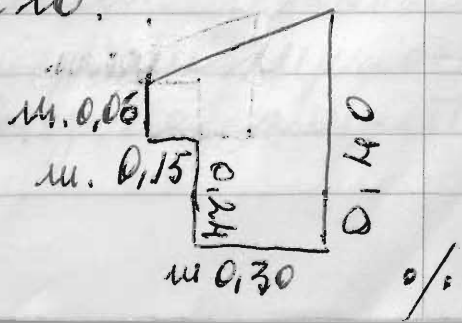

o/

Il travetto di legno  
 posto sulla trave è  
 in un'apertura sopra  
 descritto ha il seguente  
 profilo.



è stato rinvenuto  
 tra il materiale di  
 risulta in un  
 per pentole di terracotta  
 grezza del tipo m.  
 di frammenti e ne  
 mancano una buona  
 parte dell'orlo -

In data 8.5.73 Il lavoro è continuato  
 come nei giorni  
 precedenti, si sono  
 nei piani superiori  
 della zona sud-est.

Quadrat 9-5-73

Il lavoro di reato  
 continua nella  
 zona est. all'altrezza  
 del tetto del peristilio  
 dell'ambiente n. 32, a  
 lato nord-est del  
 soffitto è stato  
 rinvenuto un pezzo  
 di stucco della misura  
 seguente: m. 0,60 x 0,38  
 il pezzo è un'offesa  
 che configura una  
 scena di caccia al  
 cervo, si nota un  
 cane che rincorre  
 il cervo e un amovibile  
 decorato di arco e frecce  
 nello stesso posto è  
 stato trovato un'antefissa  
 per cappi frammentata  
 e un frammento  
 di marmo di cui



ritto in'ansa ad  
quello e una parte  
dell'occhio e del corpo.

In data 10-5-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti, si lavora  
nella zona est, sulla  
parte ancora alta  
dell'edificio Tramuzzi  
e osservo che alcuni  
che portano nel peristilio  
dell'ambiente n. 32,  
si ricompongono gli  
stucchi; Tra i materiali  
si risulta e emerge  
una tegola di marone  
dalle seguenti misure:  
m. 0,51 x m. 0,27

In data 11-5-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

si scende nei gli ambienti  
 del piano superiore del  
 peristilio dell'ambiente n. 32  
 e' venuta alla luce una  
 scala, che si immette su  
 due camerette, di cui se  
 da un muretto in cartongesso  
 e gesso (buventano),  
 sul pavimento su calciastruzzo  
 di cui una di questo, quella  
 più vicina alla scala,  
 e' stata rivestita con  
 marmo di piccole dimensioni  
 m. 0,05 di altezza e m. 0,08  
 compreso m. 0,08 lunghezza  
 e m. 0,06 di larghezza  
 montate nella parete  
 superiore con matite  
 incise.

In data 12.5.73 il lavoro continua  
 come nei giorni

precedenti, si sono, nell'ambiente  
 n.º 32 sono state sulla  
 due ancora 5 colame  
 la continuazione del  
 primitivo di detto ambiente.

In data 13-5-73 Coattiere fermo

In data 14-5-73 Il lavoro continua  
 come nei giorni precedenti  
 si sono sulla zona est  
 nel primitivo dell'ambiente.  
 n.º 32

In data 15-5-73 Si ricominciano  
 i lavori degli ambienti  
 n.º 1-2-27-28-29-30  
 si procede alla  
 messa in opera  
 dello stesso nell'amb.  
 n.º 34

In data 16-5-73 Il lavoro continua  
nella ricostruzione  
dei solai, e si ricompa-  
no gli stucchi dei  
vari ambienti.

In data 17-5-73 Il lavoro continua  
come nei giorni precedenti.  
si procede alla ricostruzio-  
ne dei solai degli amb.  
citati in precedenza, e  
si stuccano gli stucchi  
nei vari ambienti.

In data 18-5-73 Il lavoro continua  
come nei giorni precedenti.  
inoltre si riprende lo  
scavo nel peristilio dell'  
ambiente n. 32

In data 19-5-73 Il lavoro continua  
nella ricostruzione

dei solai degli ambienti  
citati in precedenza.

20-5-73

Caratteristiche generali

21-5-73

Si sono completati i solai  
degli ambienti; 1-2-27-28-29 e 30  
rifacendo il lastrico di cemento  
nell'ambiente n° 32 e si  
ricambiano gli stucchi  
scostando nell'ambiente  
n° 37 a circa un metro  
dal pavimento sono  
venute alla luce due  
lucernette di Ferrarese  
grosso, mancante della  
griglia ed quello sul  
pavolo recano il marchio  
in planta pedis.

Lunedì 22-5-73

Si ricostruiscono  
le colonne del peristilio

Trasversalmente al  
 corso del canale, si  
 ricentrano i muri  
 degli ambienti del  
 primitivo dell'ambiente  
 n° 24, negli ambienti  
 superiori degli ambienti  
 40 e 41, sul pavimento  
 in calcinuzzo abbattuto  
 è stato rinvenuto un  
 piatto di terracotta, in  
 frammenti, ricentrabile.

In data 27-5-73

Il lavoro continua come  
 nei giorni precedenti,  
 sul pavimento dei piani  
 superiori degli ambienti  
 40-41 e (32 primitivo)  
 sono stati rinvenuti tra  
 i materiali di risulta  
 frammenti di terracotta  
 bruciata (circa la metà)

si' un piatto, e un  
 coperto per pentolino  
 di terracotta grezza

Indato 24-5-73 Il lavoro continua come  
 nei giorni precedenti, si  
 ricompongono gli stacchi  
 e si procede alla ricostituzio-  
 ne dei muri degli  
 ambienti lungo il peristilio  
 n° 24, si ricostituiscono  
 pure le colonne del  
 peristilio trasversale  
 al corso del canale

Indato 25-5-73 Il lavoro continua come  
 nei giorni precedenti, si  
 procede alla ricostituzione  
 delle colonne del peristilio  
 trasversalmente al corso  
 del canale, si restaurano  
 i muri dei vari ambienti.

del peristichio n. 24 e si  
scava nell'ambiente n. 41

In data 26-5-73 si restaurano gli amb. n. 37  
e 38 del peristichio n. 24  
lungo il corso del canale  
si è completato lo sgombero  
del materiale luvico  
nell'ambiente 41.

In data 27-5-73 Caschiere pieno

" " 28-5-73 Il lavoro continua nel  
restaurare i muri  
degli ambienti n. 37  
e 38, si procede al  
recupero dello stucco  
del soffitto dell'amb. 38  
ed allo smontamento  
del materiale luvico  
nell'ambiente stesso

./.



- In data del 19-5-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti, si ricominciano  
gli stucchi e cooperati  
nei vari ambienti  
della zona sud-est.
- " " 20-5-73 Si riprende il lavoro  
per completare i solai  
degli ambienti n. 1-2-24-25-  
29 e 30, e si ricominciano  
gli stucchi dei vari  
ambienti della zona  
sud-est.
- " " 31-5-73 Cantiere fermo
- " " 1-6-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.
- " " 2-6-73 Cantiere fermo

In data 3-6-73 Cantiere primo

" " 4-6-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti; si è completato  
gli stacchi degli amb. n. 38  
e 39 e si completano  
i solai degli ambienti:  
1-2-27-28-29 e 30.

" " 5-6-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

" " 6-6-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

" " 7-6-73 Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti.

" " 8-6-73 Il lavoro continua  
come nei giorni precedenti.  
Si è completato lo scintillio  
ne dei solai.

Indice 5-6-73. Sono stati iniziati lavori  
di scavo archeologico nel  
cimitero di S. Maria.  
Sono emersi resti  
antichi con stucco

In data 9-6-73 Continuare la ricomposizione  
 ne degli stucchi e  
 quella delle colonne  
 del peristilio n. 24, tra il  
 colonnato al centro del  
 tempio - lato sud-est.  
 Al cantiere V. Tello e  
 Gianni Ferrero, si procede  
 alla ricomposizione  
 delle attrezzature e  
 pulizie in generale  
 dello scavo, da parte  
 della ditta stessa.

In data 10-6-73 Cantiere Ferrero

" " 11-6-73 Continuare la pulizia  
 e lo sgombrò del  
 materiale di riporto  
 dai vari ambienti.  
 e la ricomposizione  
 delle colonne del peristilio

n° 24 Trasversalmente  
del canale lato sud-est.

In data 12-6-73 Il lavoro continua, come  
il giorno precedente.

In data 13-6-73 Il lavoro continua, come  
nei giorni precedenti, si  
riprende la ricostruzione  
dei muri degli ambienti  
n° 37 e 38 e continua  
la ricostruzione delle  
colonne della ~~stessa~~ ambiente  
n° 24

In data 14-6-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

" " 15-6-73 Continua la ricostruzione  
delle colonne trasversal-  
mente al corso del  
canale, ~~del settore~~

e quello dei muri 60

degli ambienti n. 37-38  
e 41

In data 16-6-73 Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti; si  
restauroano le parti superiori  
dei muri degli ambienti  
n. 37-38-41

" " 17-6-73 Continuare lavoro, (opera) per  
conto della "Ditta  
T. T. T. T." hanno proceduto  
al finissage dell'asfalto  
sui solari degli ambienti  
n. 1-2-27-28-29 e 30

" " 18-6-73 Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti.  
Si restaurano gli ambienti  
n. 37-38-41 e continua  
la ricostruzione delle  
colonne tra i pilastri  
sul corso del canale.

19-6-73 Il lavoro continua  
come nei giorni  
precedenti.

" " 20-6-73 " "

" " 21-6-73 Cantiere fermo

" " 22-6-73 Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti.  
Si restaurano gli ambienti  
n° 37-38 e 41, si procede  
inoltre alla messa  
in opera del soffitto  
nell'ambiente n° 37

" " 23-6-73 Il lavoro continua come  
nei giorni precedenti.

" " 24-6-73 Cantiere fermo

" " 25-6-73 Il lavoro continua come

nei giorni precedenti, inoltre  
si ricostruiscono le strutture  
degli ambienti n. 37-38 e 41  
si ricostruiscono i muri alti  
degli ambienti n. 1-2-27-28-29 e 30

In data 26-6-73 Il lavoro continua, come  
nei giorni precedenti.

" 27-6-73 Tolera

" 28-6-73 Il lavoro è continuato  
come nei giorni precedenti.  
Si è completata la parte  
alta dei solai degli amb.  
1-2-27-28-29 e 30 e si è  
proseguito alla messa  
in opera dello stesso  
della facciata degli  
ambienti 37-38 e 41 lato  
opposto al corso del  
canale nell'ambiente  
n. 24-



In data 29-6-73 Coattiere fermo

" " 30-6-73 Riprende il lavoro di scavo nella zona sud-est. sul peristilio trasferendosi al corso del canale, e continua la messa in opera dello stucco nell'ambiente n. 24

" " 1-7-73 Coattiere fermo

" " 2-7-73 Si prepara la parte lungo il canale per la estrazione di un muro in tufo per sostenere gli argini; continua la messa in opera dello stucco nell'ambiente n. 24

/

20-6-73 alle ore 13.30 si è iniziata  
una ripresa televisiva in  
(Diretta) dal Telegiornale.

In data 3-7-73 l'altoroccontinua  
 come nei giorni precedenti  
 si resta nell'amb. n. 34  
 si restaurano le colonne  
 trasversalmente al  
 corso del canale, si  
 prepara il muro di  
 sostegno degli argini

In data 14-7-73 si resta nell'amb. n. 34  
 e l'amb. n. 32, continua  
 il restauro delle colonne  
 trasversalmente al corso  
 del canale e si dà inizio  
 al restauro delle colonne  
 dell'ambiente n. 24,  
 spostando nell'amb. 32  
 si è spostato l'amb. 39  
 un piccolo vano di m. 2,70  
 di lunghezza e m. 1,35  
 di larghezza, tra i  
 matricoli di risulta

sono stati rinvenuti i  
seguenti oggetti:

- 1) Bronzo: un. 1 moneta  
di m. 0,025 diametro
- 2) Terracotta: un. 1 lucerna  
o due bechi con pino sul  
avvolto e di base decorato  
o ritratto diam. di base m. 0,125
- 3) Terracotta: anfora di m. 0,80  
di altezza (integro)
- 4) Frammenti di colomina  
di marmo finemente  
decorati o ritratto di figura umana  
di m. 0,35 e 0,25
- 5) Omo: m. 1
- 6) numerosi frammenti di  
Terracotta appartenenti  
ad anfore e vasellame  
di vario tipo.
- 7) Omo in di base con cerchi  
concentrici diam. 0,03

In data, 5-4-73 Il lavoro continua, come  
 nei giorni precedenti, in  
 Rova, nell'amb. n. 40  
 come è stato messo in luce  
 ancora, n. 3 colonna del  
 primitivo trasversalmente  
 nel corso del canale  
 di circa m. 1,50 dal punto  
 è stata rinvenuta un'antefissa  
 con un corno d'argilla  
 come si è visto nel mercato  
 raffigurante un toro con  
 le corna e un frammento  
 di ceramica scagliata con  
 un corno del mercato.

in 6-4-73 Continua la ricostruzione  
 delle colonne dell'amb. n. 40,  
 lo stesso in opera dello  
 stesso nell'ambiente n. 24  
 e la costruzione del muro  
 di sostegno dell'argine del  
 canale abitato est.

- Inchiesta 7.7.73 Continua il lavoro di ricostituzione del muro di sostegno degli argini del canale lato n. 27
- " " 8.7.73 Continuare lavoro
- " " 9.7.73 Il lavoro continua come nei giorni precedenti.
- " " 10.7.73 Continua la costruzione del muro di contenimento degli argini del canale, si riempie e si ricompone lo stacco dell'amb. n. 29
- " " 11.7.73 Inizia il restauro delle colonne nell'amb. n. 24 e dei muri dell'amb. n. 29. È stato completato il muro di contenimento dell'argine del canale.

In data 11.12.1954 è stato rinvenuto  
 un anfore con le  
 anse o 2 costanti  
 che si presentano  
 storciate e metà  
 compreso il collo e  
 manca anche la  
 punta della parte  
 inferiore lung. totale  
 massima conservata  
 è m. 0,75 e ca. quasi  
 certamente precipitata  
 dal fondo superiore  
 degli ombicchi. Rappresenta  
 all'ambiente n. 32  
 di circa m. 3 dal  
 fondamento.

Per Balzano
